SPARK Hovedtidsplan 19.06.2017
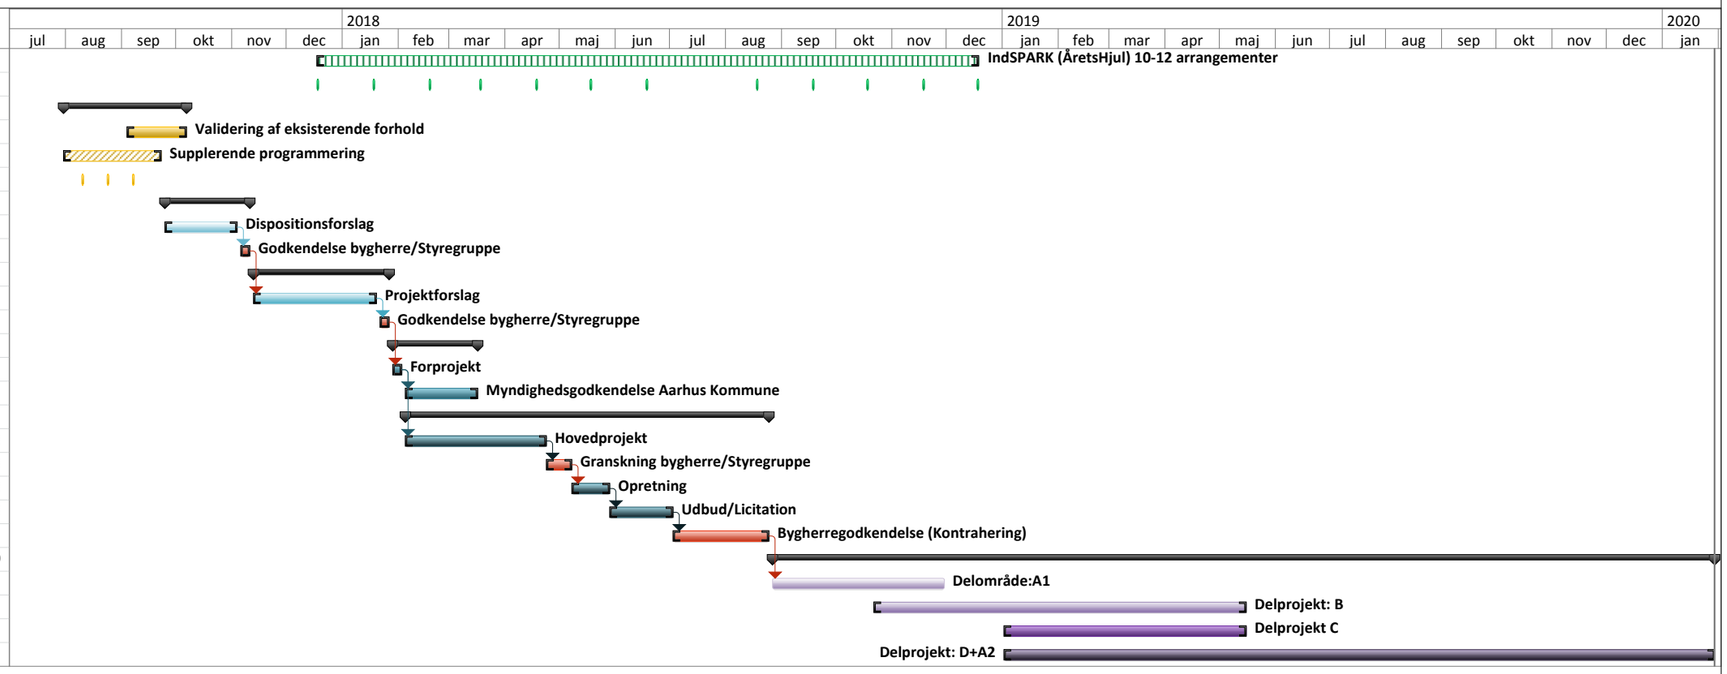
Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	IndSPARK (ÅretsHjul) 10-12 arrangementer	235 dage	ma 18-12-17	ti 18-12-18
2	IndSPARK møder	235 dage	ma 18-12-17	ti 18-12-18
16	**FORARBEJDE**	**50 dage**	**ma 31-07-17**	**fr 06-10-17**
17	Validering af eksisterende forhold	25 dage	ma 04-09-17	fr 06-10-17
18	Supplerende programmering	40 dage	ma 31-07-17	fr 22-09-17
19	Dialogmøder	21 dage	to 10-08-17	to 07-09-17
23	**DISPOSITIONSFORSLAG**	**35 dage**	**ma 25-09-17**	**fr 10-11-17**
24	Dispositionsforslag	30 dage	ma 25-09-17	fr 03-11-17
25	Godkendelse bygherre/Styregruppe	5 dage	ma 06-11-17	fr 10-11-17
26	**PROJEKTFORSLAG**	**49 dage**	**ma 13-11-17**	**fr 26-01-18**
27	Projektforslag	44 dage	ma 13-11-17	fr 19-01-18
28	Godkendelse bygherre/Styregruppe	5 dage	ma 22-01-18	fr 26-01-18
29	**MYNDIGHEDSBEHANDLING**	**35 dage**	**ma 29-01-18**	**fr 16-03-18**
30	Forprojekt	5 dage	ma 29-01-18	fr 02-02-18
31	Myndighedsgodkendelse Aarhus Kommune	30 dage	ma 05-02-18	fr 16-03-18
32	**HOVEDPROJEKT**	**124 dage**	**ma 05-02-18**	**fr 24-08-18**
33	Hovedprojekt	50 dage	ma 05-02-18	ma 23-04-18
34	Granskning bygherre/Styregruppe	10 dage	ti 24-04-18	ma 07-05-18
35	Opretning	15 dage	ti 08-05-18	ma 28-05-18
36	Udbud/Licitation	25 dage	ti 29-05-18	ma 02-07-18
37	Bygherregodkendelse (Kontrahering)	24 dage	ti 03-07-18	fr 24-08-18
38	**UDFØRELSESPERIODE**	**345 dage**	**ma 27-08-18**	**on 29-01-20**
39	Delområde:A1	69 dage	ma 27-08-18	to 29-11-18
40	Delprojekt: B	135 dage	ma 22-10-18	on 15-05-19
41	Delprojekt C	90 dage	on 02-01-19	on 15-05-19
42	Delprojekt: D+A2	260 dage	on 02-01-19	on 29-01-20
